



Memorando Nº 2818/2021 – SMO

MEMO Nº14/2021/FMSAI/SMNAP - OS Nº: 100192/2020

Departamento de Obras - Engenharia

À Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento.
Sra. Secretário Veruska Carvalho

Parecer:

1. Apresentação

O presente relatório trimestral visa atender à condicionante da Resolução nº 04 de 12 de novembro de 2.020 do Conselho Gestor do FMSAI, que dispõe:

“Art. 2º - A realização da obra será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, a qual apresentará relatórios com periodicidade trimestral para conhecimento e acompanhamento dos conselheiros, observadas as disposições do inciso VIII do Decreto Municipal n.º 4.299 de 14 de outubro de 2019.”

Neste documento, encaminhamos o **3º Relatório Trimestral de Acompanhamento de Execução da Obra de Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana e Melhoria do Sistema Viário - Estrada Tenente Marques**, demonstrando como ocorreu a sua execução durante o terceiro trimestre, Junho, Julho, Agosto compreendido entre o período de 11 de Maio de 2021 até 11 de Agosto de 2.021.

Vale ressaltar ainda que a obra está ocorrendo utilizando a Ata de Registro de Preço nº 188/2020, Requisições nº 6318/2020 e nº 6271/2020.

A realização da obra está dividida em duas fases, conforme segue:
-A fase I, dividida em trechos 1 e 2, é custeada pelos recursos da FMSAI;
-A fase 2 é custeada com reserva do próprio município conforme segue:

MAPA DE LOCALIZAÇÃO COM OS TRECHOS:

2



FASE I (Trecho 1)



FASE I (Trecho 2)



Durante a execução das obras no primeiro, segundo e terceiro trimestre, os serviços da fase I do 1º e 2º trechos foram executados, sendo a empresa Vigent Construções Ltda., responsável pela sua execução.

2. Equipe

A responsabilidade técnica pela execução da obra na fase I no trecho 1 é do Engenheiro Aldeir Alves dos Santos, conforme ART abaixo:

P



ART de Obras ou Serviços nº 28027230201476298

A responsabilidade técnica pela execução da obra na fase I no trecho 2 é do Engenheiro Aldeir Alves dos Santos, conforme ART abaixo:

ART de Obras ou Serviços nº28027230201476451

A responsabilidade técnica pela fiscalização das obras na fase I nos trechos 1 e 2 é do Engenheiro João José dos Santos, conforme ART abaixo:

ART de Obras ou Serviços nº 28027180210707457

A elaboração do presente Relatório foi de responsabilidade da equipe da SMO, sendo elaborada pelo engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Secretário Municipal de Obras.

3. Serviços

Durante a execução das obras do primeiro, segundo e terceiro trimestres, foram emitidas as seguintes notas fiscais:

NOTAS FISCAIS	VALOR (R\$)
N ° 482	2.131.464,64
N ° 522	1.261.808,40
TOTAL MEDIDO NO 1º TRIMESTRE	3.393.273,04
N ° 532	656.717,56
N ° 557	211.290,94
N ° 614	424.711,51
N ° 615	1.510.401,38
TOTAL MEDIDO NO 2º TRIMESTRE	2.803.121,39
TOTAL MEDIDO NO 1º E 2º TRIMESTRE.	6.196.394,43
Aprovado = 7.484.493,53 Medido = 6.196.394,43	Saldo = 1.288.099,11
N ° 651	1.283.143,16
TOTAL MEDIDO NO 3º TRIMESTRE	1.283.143,16
TOTAL MEDIDO NO 1º, 2º, 3º E ÚLTIMO TRIMESTRE.	7.479.537,59
SALDO DO 1º, 2º, 3º E ÚLTIMO TRIMESTRE.	4.955,94

Os serviços realizados vinculados a NF nº 482 e 522 foram:



Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na Estrada Tenente Marques, na fase 1 do 1º trecho, entre a Rua Gabriel Jorge Salomão e a Rua Sergipe, no Município de Santana de Parnaíba. “Conforme demonstrado no relatório 1”.

Os serviços realizados vinculados a NF nº 532, 557, 614 e 615 foram:
Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na Estrada Tenente Marques, na fase 1 do 2º trecho, entre a Estrada Sílvio Epifânio de Oliveira até a estaca 34 + 13 m situada a 160,00 m do eixo da Rua Lourenço Salvador, no Município de Santana de Parnaíba. “Conforme demonstrado no relatório 2”.

Os serviços realizados vinculados a NF nº 651 “anexo1” foram:
Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na Estrada Tenente Marques, na fase 1, 2º trecho entre a Estrada Sílvio Epifânio de Oliveira até a estaca 34 + 13 m situada a 160,00 m do eixo da Rua Lourenço Salvador, no Município de Santana de Parnaíba. Conforme relatório fotográfico “anexo 2”.


4. Conclusão

Os serviços foram executados e concluídos de acordo com as normas vigentes e especificações técnicas de pavimentação e drenagem da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Atesto que as obras da Fase I, trechos 1 e 2, custeada pelos recursos do FMSAI, em epigrafe foram por mim vistoriadas, in loco, foram executadas e concluídas.

Conforme relatório fotográfico final “anexo 3”.

Santana de Parnaíba 25 Agosto de 2021



João José dos Santos
Engenheiro Civil



Engº Edilson José da Silva Nunes
Secretário Municipal de Obras.



“ ANEXO 1”



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	23/08/2021	16:59	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	824Q.7403.6713.0310799-T		000651	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA RUA RUBI , 101 - Sala SALA 02 JARDIM DOS CAMARGOS / BOA VISTA CEP 06410-160 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 15.320.722/0001-09 Telefone	Inscrição Municipal	5.66092-7	e-mail
-----------------------	---	---------------------	-----------	--------

Nome Tomador de Serviços	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	CPF/CNPJ	46.522.983/0001-27
--------------------------	----------------------------------	----------	--------------------

Endereço	RUA PEDRO PROCOPIO, 213	Complemento	
CEP	06501-130	Bairro	CENTRO
		Cidade	SANTANA DE PARNAIBA
		UF	SP

e-mail: engjoajs@gmail.com

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSTRUÇÃO CIVIL	070201216	0,00	128.314,32	128.314,32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA TENENTE MARQUES, TRECHO ENTRE A CHÁCARA SOLAR E ENTRADA DO BAIRRO DAS GARÇAS.
5ª MEDIÇÃO / PEDIDO: 4859/2020 / ATA: 188/2020 / PROCESSO: 76/2020 / CP: 02/2020
MÃO DE OBRA APLICADA PAVIMENTAÇÃO: R\$ 128.314,32;
MATERIAL APLICADO: R\$ 1.154.828,84;
ISS: R\$ 2.566,29;
INSS (11%): R\$ 14.114,57.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) - AG. 2056 - C/C 13.002445-0.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.154.828,84	Observações	ISSQN devido a: SANTANA DE PARNAIBA-SP
--------------------------------	------------------	-------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.283.143,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade	824Q.7403.6713.0310799-T
--	----------------------	--------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	000651	
Local	Date	Assinatura



“ ANEXO 2”



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA MUNICIPAL

OBRAS EXECUTADAS PELA EMPRESA VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA.

3 º RELATORIO FOTOGRÁFICO TRIMESTRAL DA FASE I TRECHO 2

OBRAS DE RECONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA TENENTE NA FASE I TRECHO 2, ENTRE A ESTRADA SÍLVIO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA ATÉ A ESTACA 34 + 13,00M SITUADA A 160,00 M DO EIXO DA RUA LOURENÇO SALVADOR.





FOTO 01



FOTO 02





FOTO 03



Foto 04





FOTO 05



FOTO 06





FOTO 07



FOTO 08





Foto 09



FOTO 10





FOTO 11



FOTO 12





FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16





FOTO 17



FOTO 18





FOTO 19



FOTO 20





FOTO 21



FOTO 22





FOTO 23



FOTO 24

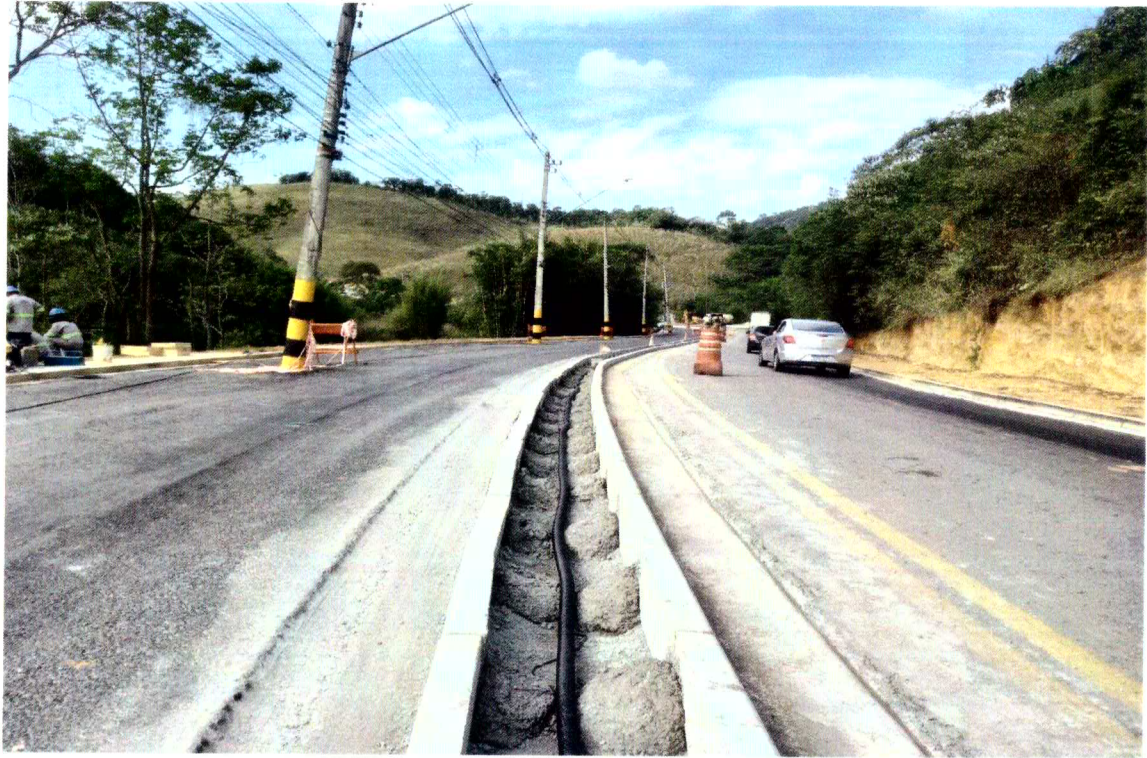


FOTO 25



FOTO 26





FOTO 27



FOTO 28





FOTO 29

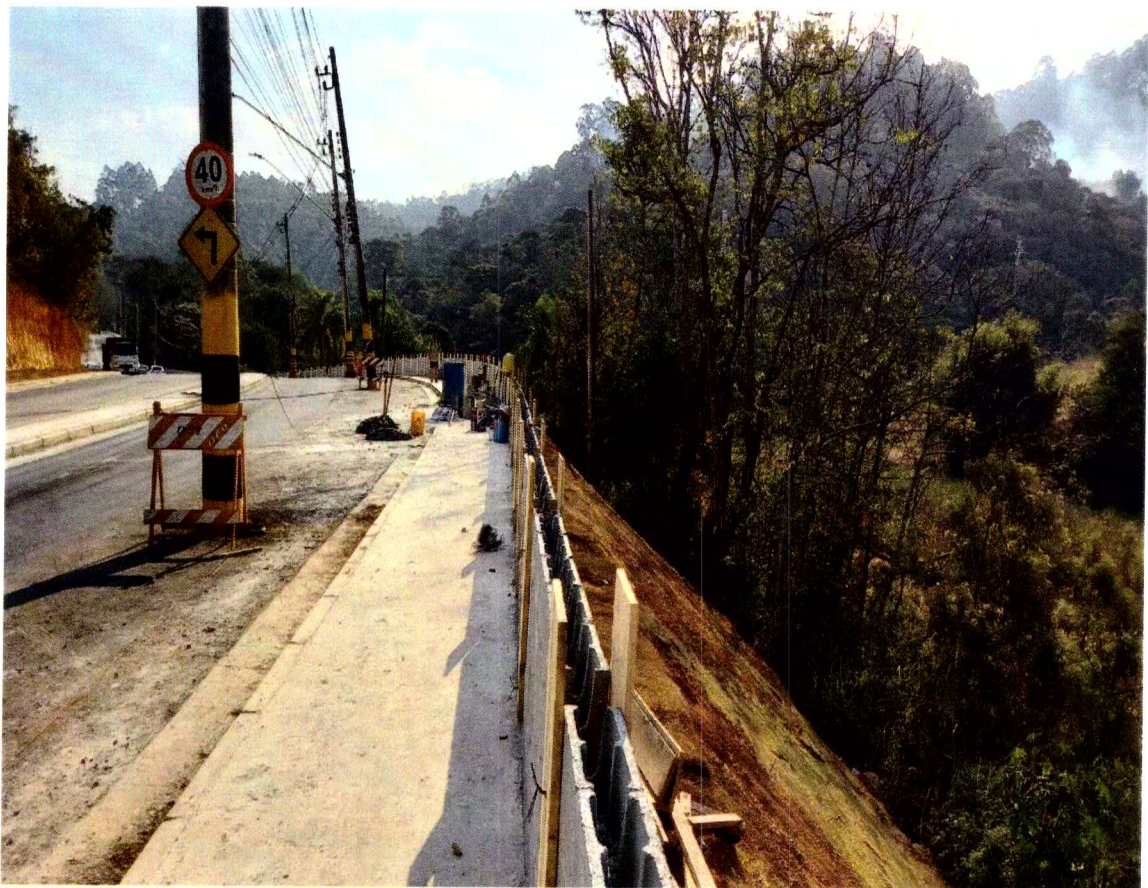


FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



FOTO 33

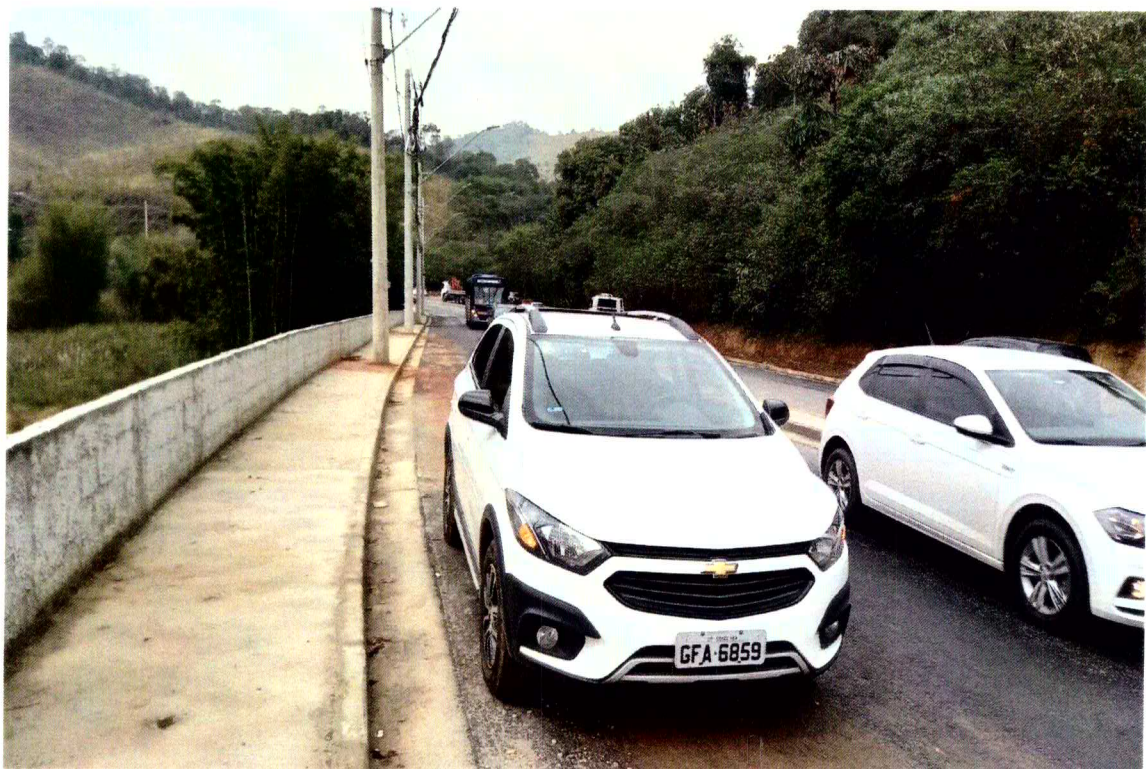


FOTO 34



FOTO 35



FOTO 36



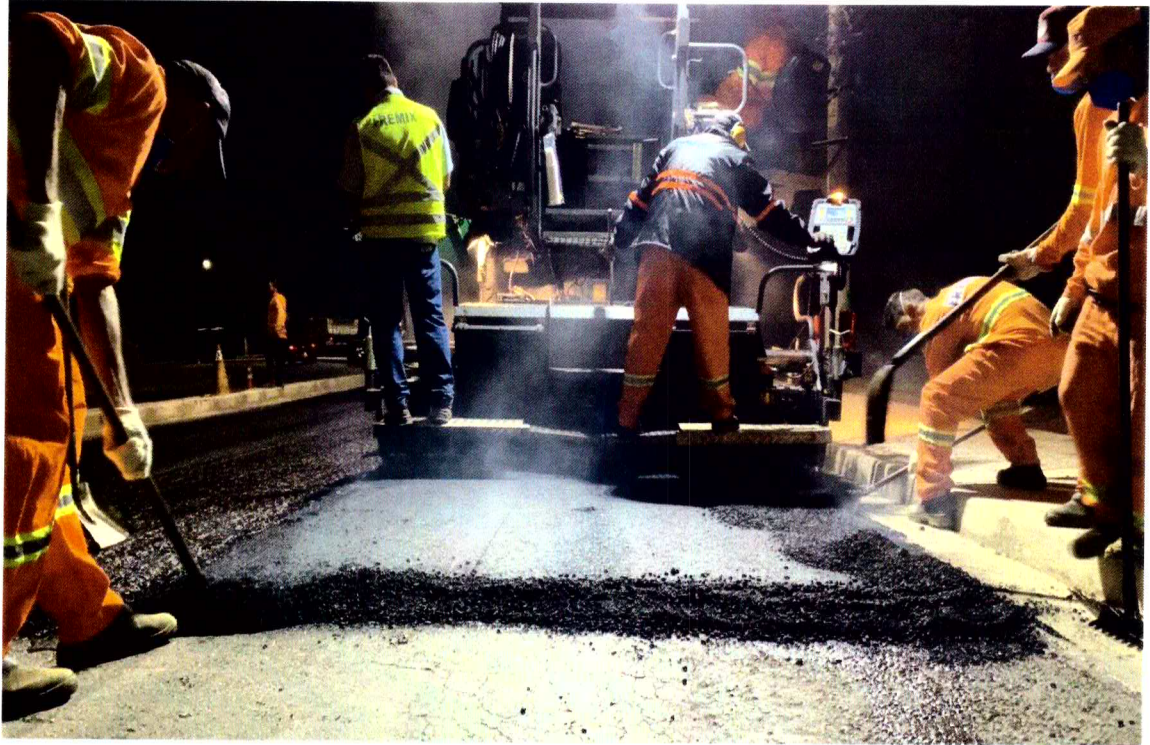


FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39

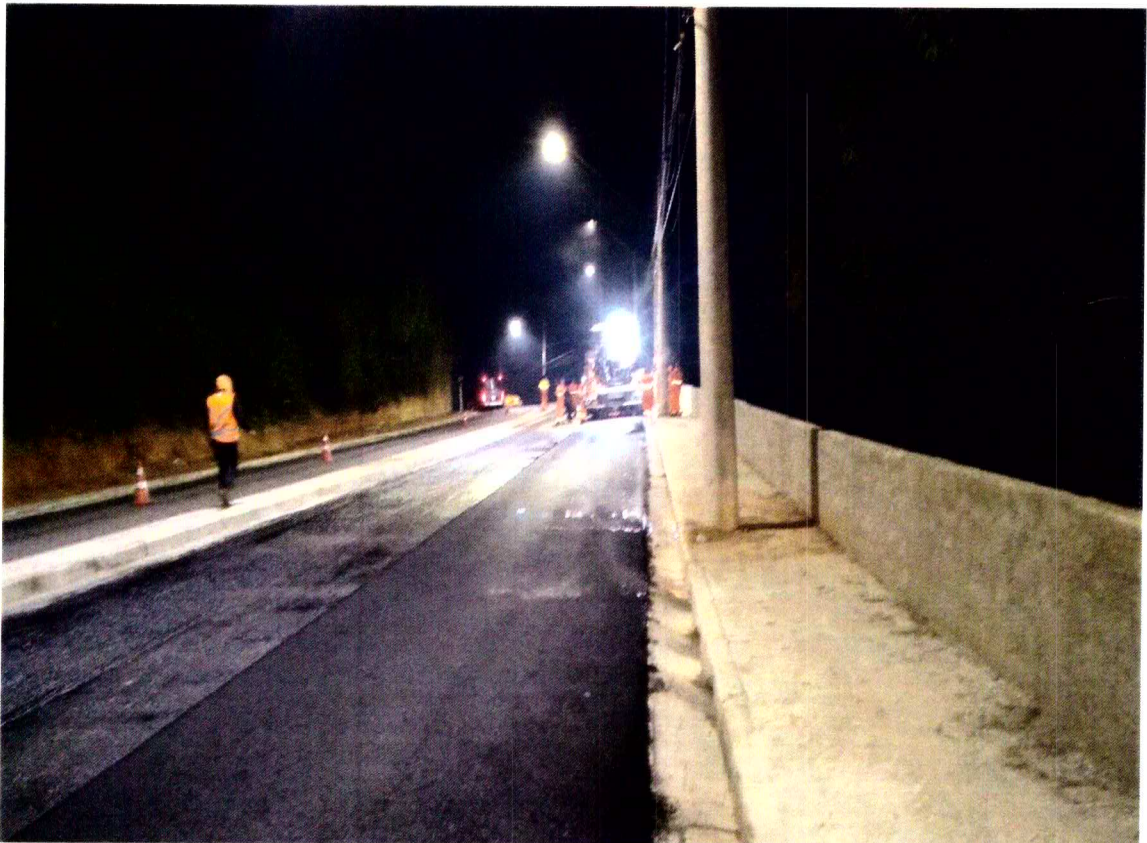


FOTO 40





FOTO 41

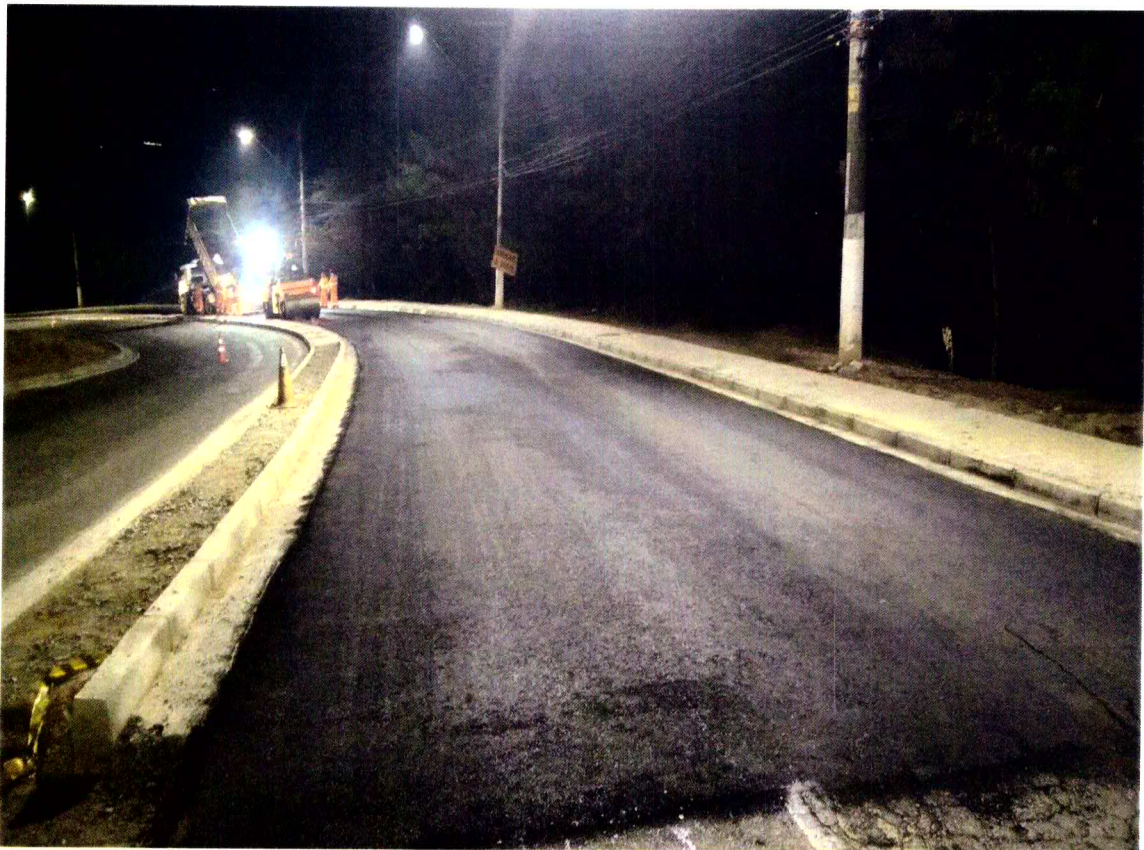


FOTO 42

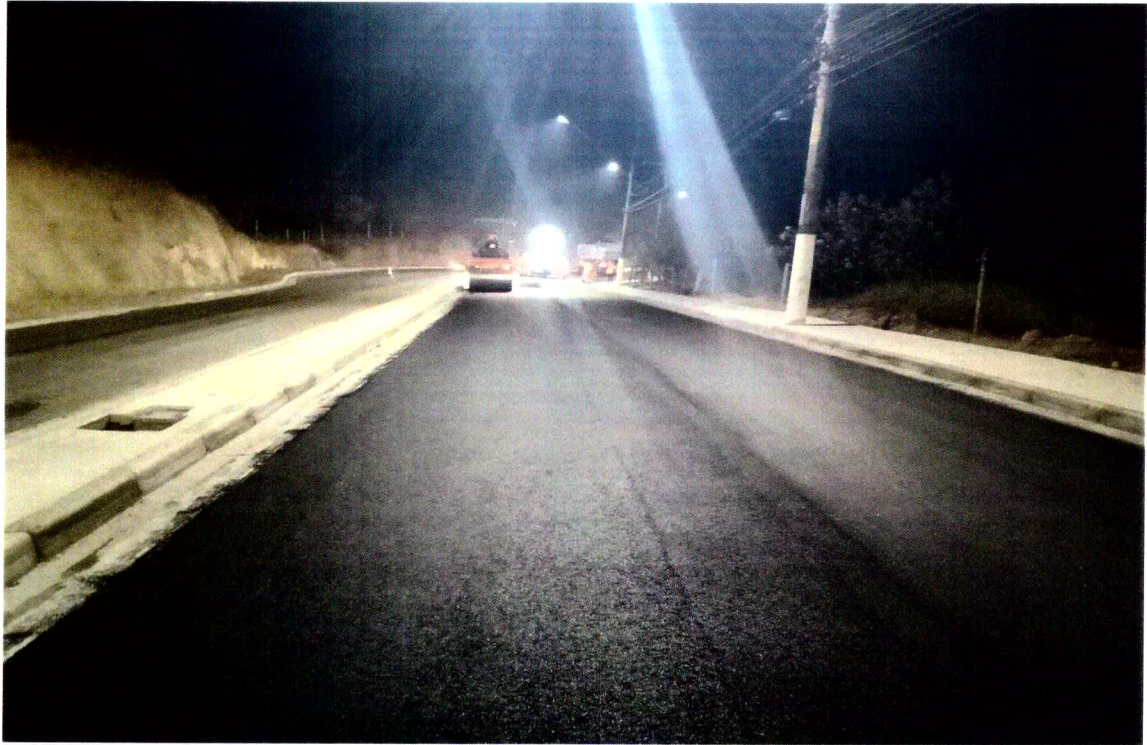


FOTO 43

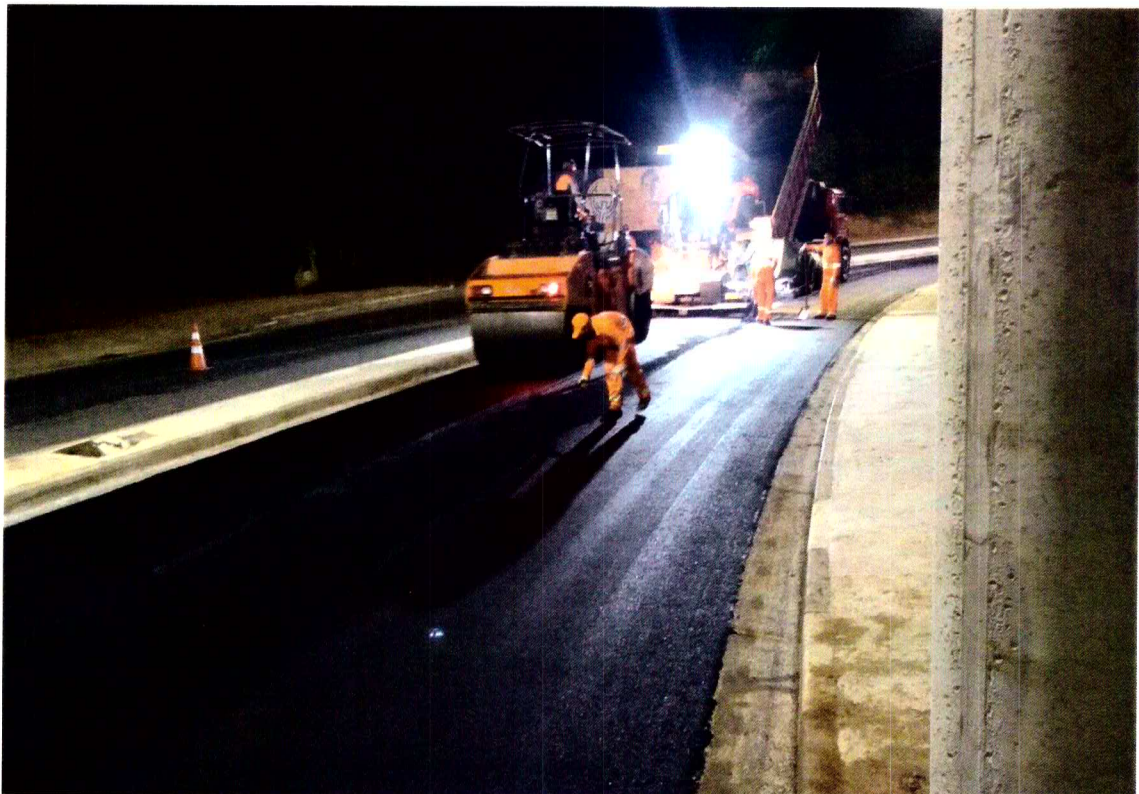


FOTO 44



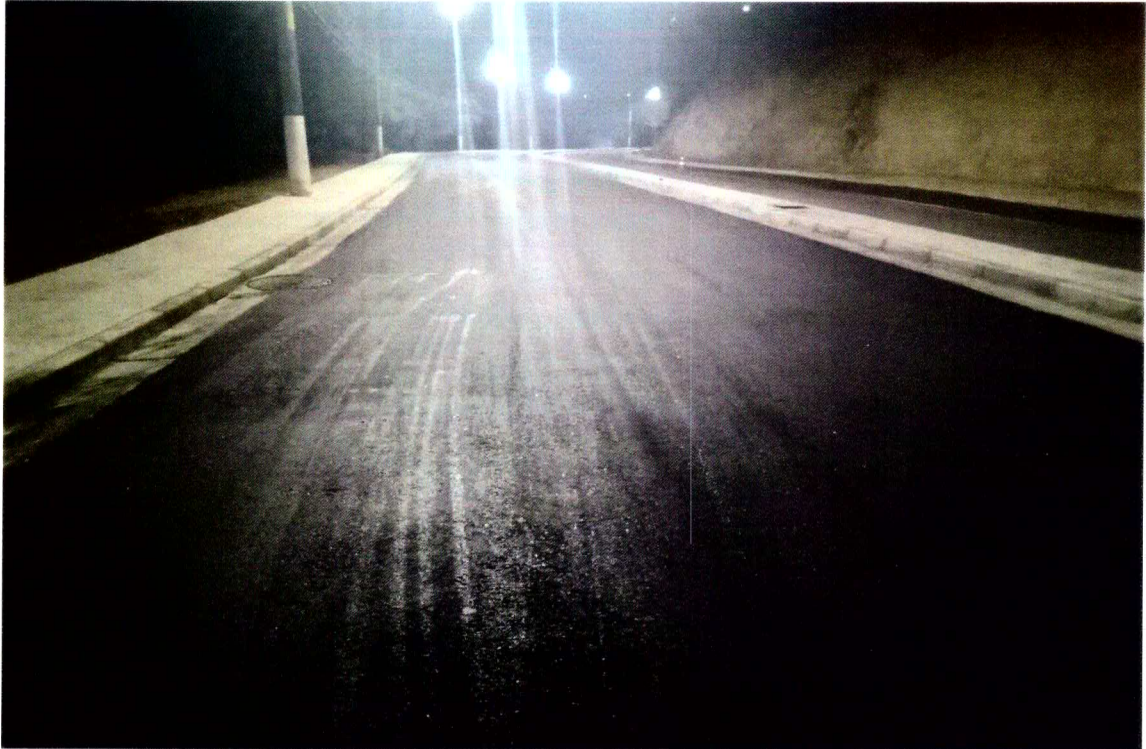


FOTO 45

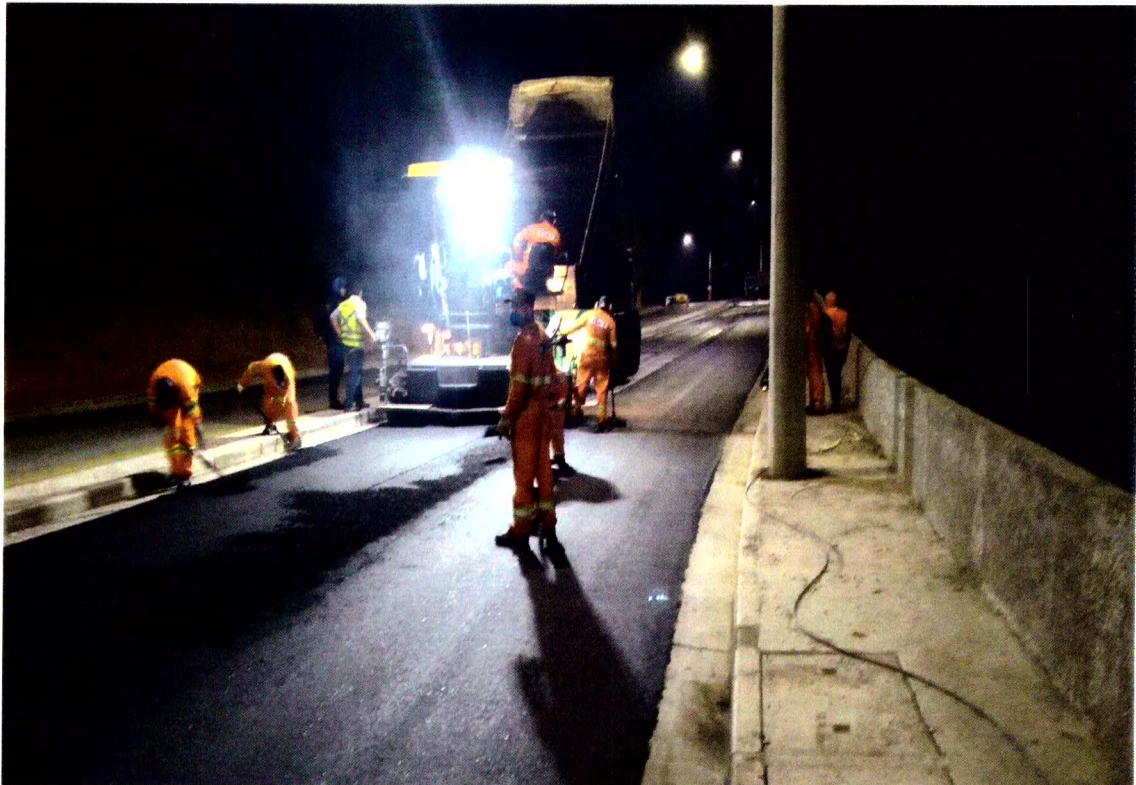


FOTO 46



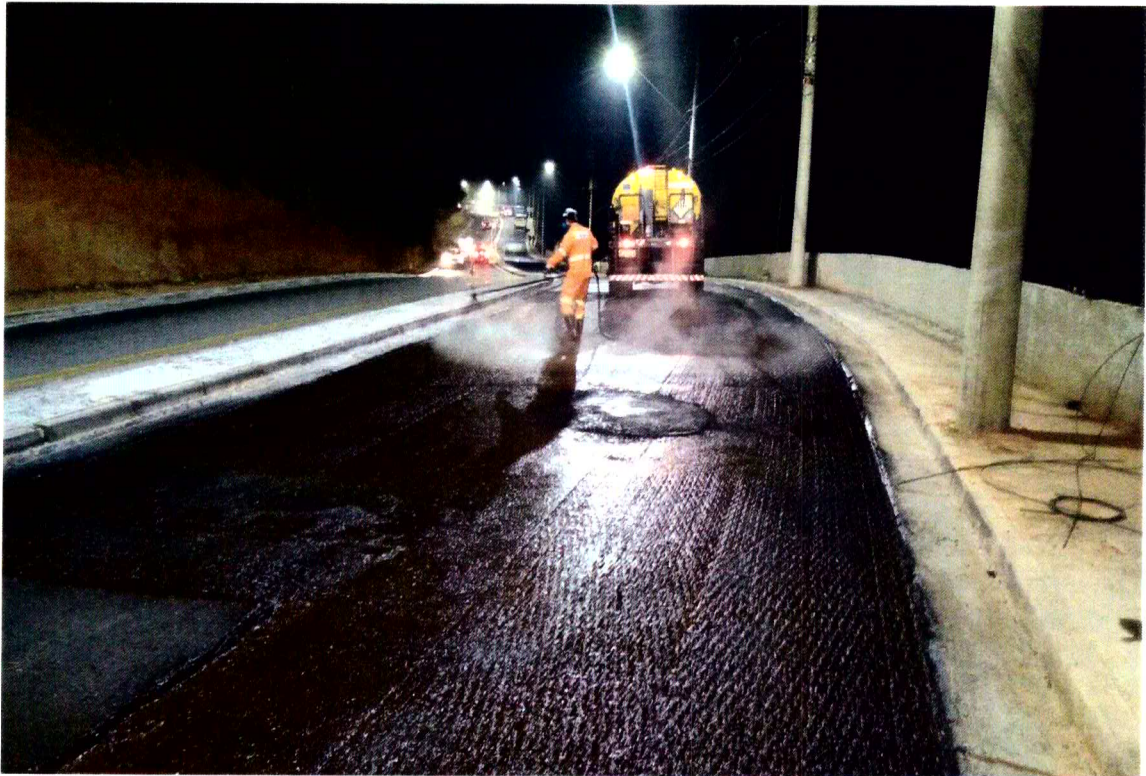


Foto 47

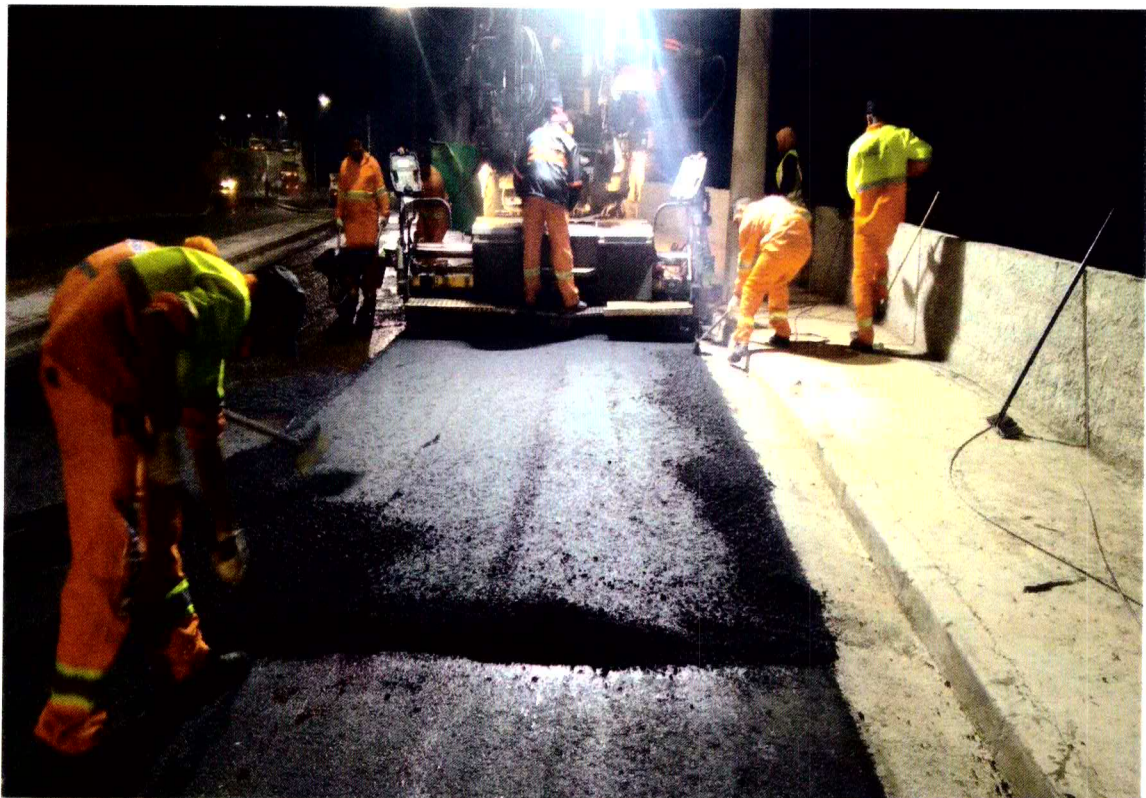


Foto 48

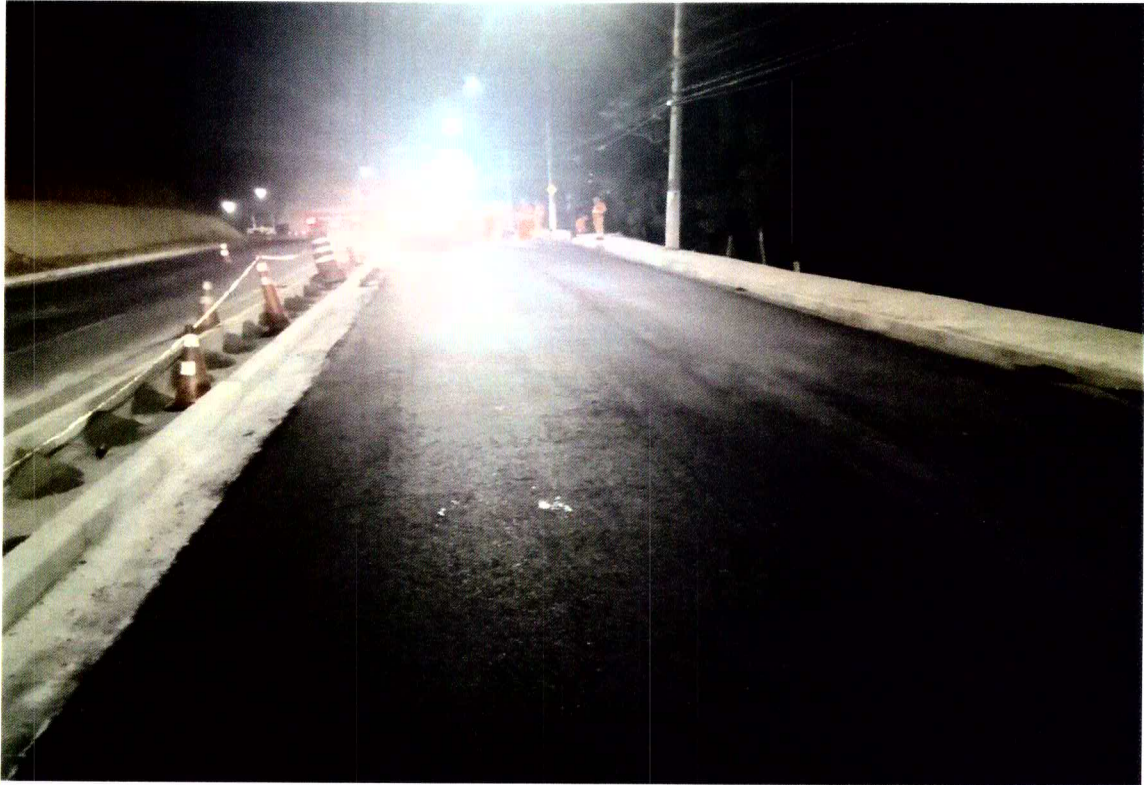


Foto 49

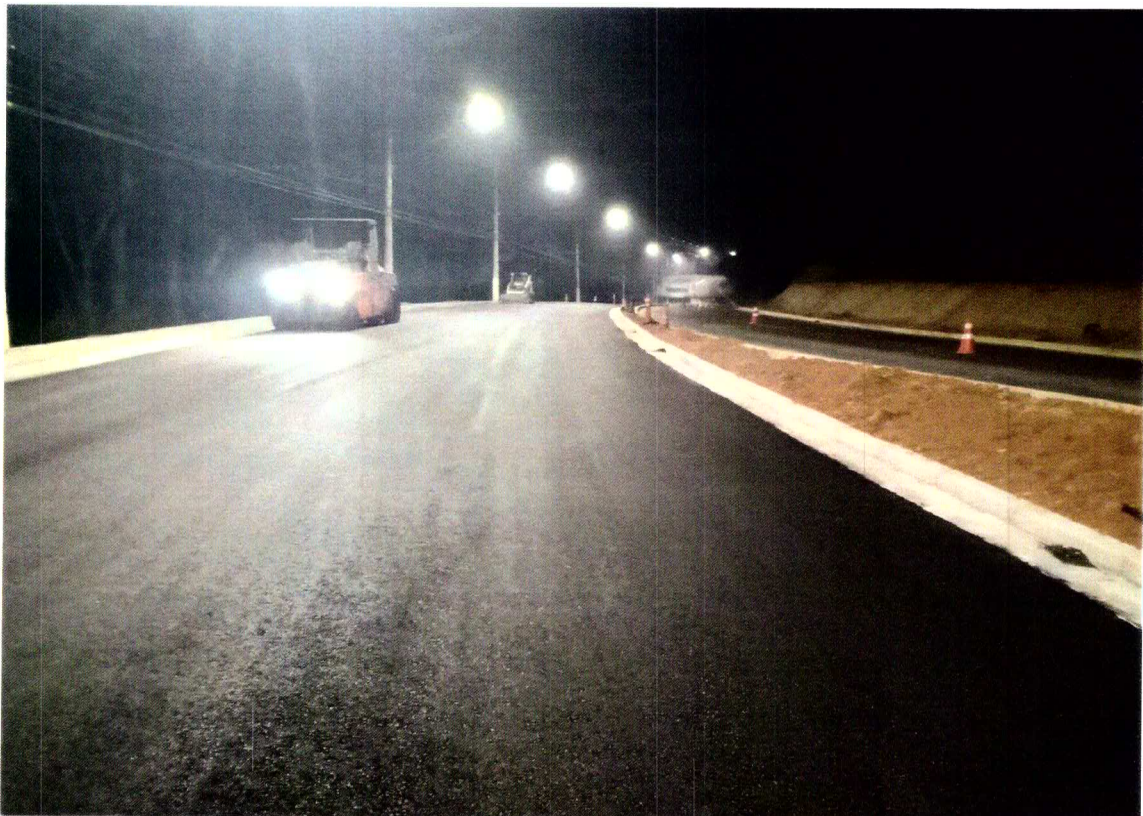


Foto 50





Foto 51

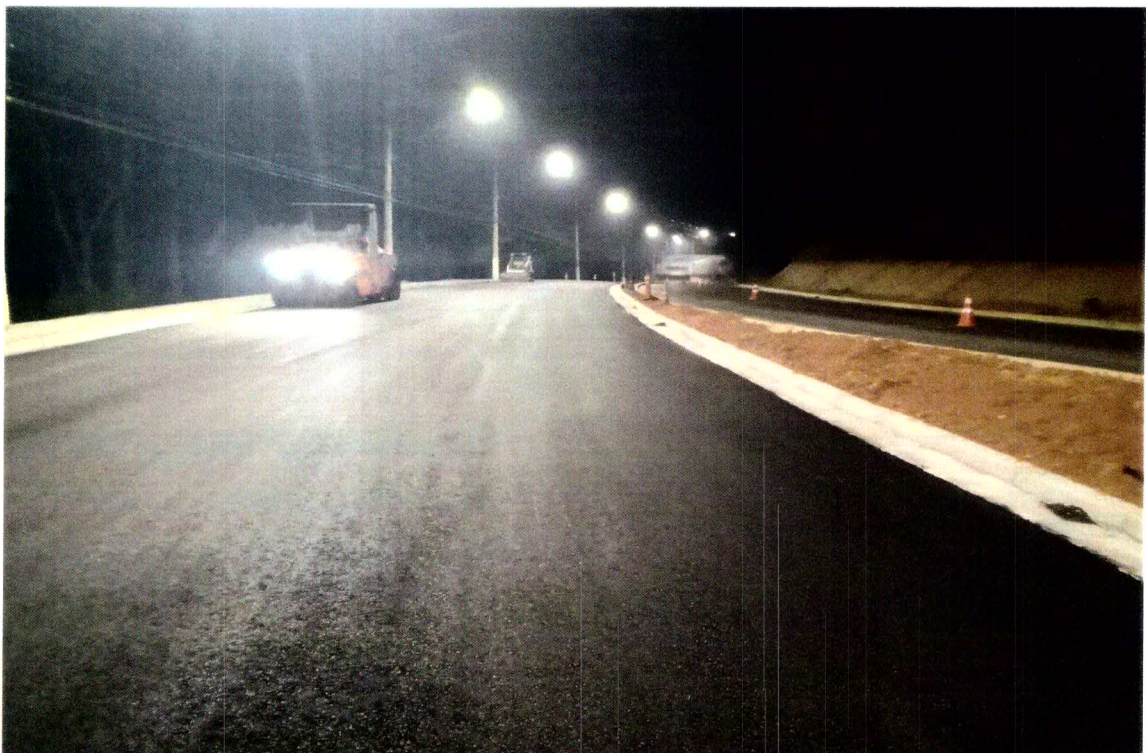


Foto 52





Foto 53



Foto 54

Santana de Parnaíba 25 de Agosto de 2021

João José dos Santos
Engenheiro Civil

